# 昌平区镇级污水处理设施建设运营项目 小汤山镇再生水厂一期工程

# 水土保持监测总结报告

建设单位:中节能燕龙(北京)水务有限公司

监测单位: 国水江河(北京)工程咨询有限公司

2019年4月

# 昌平区镇级污水处理设施建设运营项目 小汤山镇再生水厂一期工程

# 水土保持监测总结报告

建设单位:中节能燕龙(北京)水务有限公司

监测单位: 国水江河(北京) 工程咨询有限公司

2019年4月



# 生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书

(副本)

单位名称: 国水江河(北京)工程咨询有限公司答

法定代表人: 普忠良

单 位 等 级: ★★ (2星)

证书编号:水保监测(京)字第0024号

小汤山镇再生水厂 期: 自2017年07月21日至2020年09月30日

发证时间: 2017年07

GSJH-0123-STJC

监测单位地址:北京市西城区广安门南滨河路 27号

监测单位邮编: 100053

项目联系人: 杨怀值

联系电话: 010-63409221

电子信箱: Shuibao513@163.com

]	项目名称	昌平区镇级污水处理设施建设运营项目小汤山镇再 生水厂一期工程				
* 3	建设单位	中节能燕龙(北京)水务有限公司				
	监测单位	国水江河(北京)工程咨	省有限公司			
Ţ	审 定	普忠良	为步星			
	总监测工程师	杨怀值	杨怀值			
	监测工程师	张 薇	张薇			
监测 项目部		吴 楠	A CO			
	监测员	王克	WW			
	THE AV1 Y	李强	38			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	交 核	张 薇	张薇			
#	<b>设告编写</b>	王克	2/2/			
参加监测人员		李强	63			
		杨怀值	杨怀值			
		吴 楠	MA E			
		王克	7 5			

# 目 录

1	项	目及水土保持工作概况	1
	1.1	项目概况	1
	1.2	水土流失防治工作情况	4
	1.3	监测工作实施情况	6
2	监	测内容与方法1	1
	2.1	监测内容1	1
	2.2	监测指标和方法1	3
3	重	点部位水土流失动态监测1	4
	3.1	防治责任范围监测1	4
	3.2	取土(石、料)监测结果1	7
	3.3	弃土(石、渣)监测结果1	7
4	水	土流失防治措施监测结果2	0
	4.1	工程措施监测结果2	0
	4.2	植物措施监测结果2	5
	4.3	临时防治措施监测结果2	9
	4.4	水土保持措施防治效果3	6
5	土	壤流失情况监测3	8
	5.1	水土流失面积3	8

	5.2	土壤流失量	38
	5.3	取土(石、料)弃土(石、渣)潜在水土流失量	39
	5.4	水土流失危害	39
6	水	土流失防治效果监测	40
	6.1	开发建设项目水土流失防治指标	40
	6.2	北京市房地产项目水土流失防治指标	42
7	结	论	45
	7.1	水土流失动态变化	45
	7.2	水土保持措施评价	.45
	7.3	存在的问题及建议	45
	7.4	综合结论	46

# 1 项目及水土保持工作概况

# 1.1项目概况

### 1.1.1 项目区基本情况

### 1.1.1.1 项目地理位置

昌平区镇级污水处理设施建设运营项目小汤山镇再生水厂一期工程位于昌平区小汤山镇,具体四至范围为: 赴沟路以东、现状北六环路以北、秦北路以西, 蔺沟河以南,南距现状六环路北红线 200m。蔺沟河东侧(现状百果采摘园内)。

### 1.1.1.2 建设规模及建设性质

水厂规划总占地面积 14.01hm², 其中一期建设用地 6.19hm², 二期建设用地 4.01hm², 本次只建设一期工程。项目总建筑面积 9924.21m², 全部为地上建筑面积,建筑密度 39.38%, 容积率 0.16, 绿地率 41.2%。机动车停车位 12 个, 自行车车棚 1 个。

### 1.1.1.3 项目组成

本项目为新建项目,工程内容主要包括建构筑物工程、道路工程、管线工程、 绿化工程四部分。

### (1) 建构筑物工程

小汤山镇再生水厂一期工程主要建筑物有综合楼、机电修间、雨水收集池、传达室、车棚、粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉沙池、生物池、二沉池膜车间、臭氧接触池、清水池、配水泵房、贮泥池、进水泵房配电室、鼓风机房、鼓风机房配电室、加药加氯间、臭氧置备间、氧源、配水泵房配电室、脱水机房、脱水机房配电室、污泥运转间、进水水质仪表间、出水水质仪表间等。

#### (2) 道路工程

厂区行车主路宽 6 米, 其他路宽 4 米。主要道路转弯半径为 9 米, 污泥转运间周边道路转弯半径 12 米, 行车路与建筑物入口处引道转弯半径为 6 米, 小道处转弯半径为 4 米, 人行步道宽度为 2 米, 厂区主入口道路宽度为 9 米。

项目建设区内共设自行车棚一个,长 15m,宽 3m,位于综合管理楼的西侧,占地面积 45m²,采用透水砖铺装。停车位共为 12 个,每个规格长 6m,宽 3m,面积约为 216m²,位于综合管理楼的西侧。

### (3) 管线工程

雨水管道:沿厂区南北向干道自南向北敷设雨水干管,收集雨水后,可排入厂外雨水管进而排入蔺沟河。雨水管管径 D=300~1200mm,全长 1998m。

污水管道:沿厂区南北向干道自南向北敷设污水干管,收集道路两侧建、构筑物的污水,下游接入小汤山镇镇再生水厂一期工程设计进水泵房前集水井内,进入污水厂进行处理。污水管管径 D=300~800mm,全长 1170m。

给水管道:厂区给水管接自市政给水管道,主要为污水厂提供生活、生产及消防用水。厂区给水管道设计为生活—生产—消防三者合一的共用给水系统,并且按环行设计,干管直径为 DN20~ DN160mm。

污水管道: 厂区污水工艺管道为连通各污水处理构筑物间的管道, 管道均采 用焊接钢管。管道类型为钢管、不锈钢管和除臭管, 共长 1962m。

再生水管道:本厂的再生水可作为污水厂厂内污泥脱水机滤布冲洗、热泵热交换用水及绿化、冲厕、洗车、浇洒道路等用水,管径 DN25-200mm,全长 1272m。

热力管道: 厂区热力管道采用预制直埋保温管。厂区热力管道入户设热力入口,包括热力检查井及平衡阀、截止阀、过滤器、压力表、温度计等热力入口装置。采用无缝钢管 DN25-DN100mm,管线全长 1200m,管线埋深 1.3m。

#### (4) 绿化工程

本工程实施绿化面积 2.55hm², 绿化率 41.2%。厂前区保留中心绿地和建筑小品用地,做到高低结合、点面结合、错落有致; 生产区绿化则应根据构筑物和道路的几何形状,考虑防尘、防晒及隔音的不同要求。栽植多种类型植物,绿地按照乔灌木占 70%, 草坪占 30%构成,建成节水型草坪。树种的选择上尽量选用耐旱草种和树种,以减少浇水次数。绿地采用喷灌的灌溉方式,绿化用水来源于项目区的雨水和中水。

### 1.1.1.4 占地面积

本期工程规划总占地面积 7.79hm², 其中永久占地为 6.19hm², 临时占地为 1.60hm²; 实际占地面积 7.34hm², 其中永久占地 6.19hm², 临时占地 1.15hm², 项目用地主要为果园和农村道路用地等。

### 1.1.1.5 土石方量

工程建设实际完成土方挖填总量为 26.94 万 m³, 其中挖方总量 16.20 万 m³,

填方总量 11.26 万 m³, 无借方, 余方 4.94 万 m³ 运往利昌环境卫生服务中心阿苏卫渣土消纳场。土石方具体情况可见土石方平衡表 1.1-1。

表 1.1-1

七石方平衡表

单位: 万 m<sup>3</sup>

项目组成	实际实施						
<b>火口组成</b>	开挖	回填	调出	调入	余方	去向	
建构筑物工程防治区	12.65	1.56	6.15		4.94		
道路硬化面及管线工程区	2.51	3.31		0.80		利昌环境卫生	
绿化工程区	0.69	6.04		5.35		服务中心阿苏	
施工生产生活区	0.35	0.35				卫渣土消纳场	
合 计	16.20	11.26	6.15	6.15	4.94		

### 1.1.1.6 投资情况

本项目总投资 4.54 亿元,其中工程费 2.42 亿元,所需资金全部由中节能燕龙(北京)水务有限公司筹资。。

### 1.1.2 项目区自然环境概况

### 1.1.2.1 水文气象

昌平区属暖温带半湿润大陆性季风气候。气候特点是四季分明,春旱多风,夏热多雨,秋高气爽,冬寒干燥。年平均风速为 2.4m/s,年平均气温 11.8℃,1月份最冷,平均气温-4.8℃;7月份最热,平均气温 25.8℃。历史上极端最高气温 40.6℃(1961 年 6 月 10 日),极端最低气温-27.4℃(1966 年 2 月 22 日)。最高气温常年在 35.0℃以上,出现在雨季到来之前的 6 月中旬至 7 月上旬,出现日数平均每年 9 天。最低气温常年在-14℃~-20℃之间,一般出现在 12 月下旬至 1月下旬。全年无霜期平均 210 天左右,初霜平均在 10 月下旬,终霜平均在 4 月上旬。年平均日照时数为 2732 小时。年平均降水量 574mm,雨量占降水总量的97%,7~8 月汛期降水量占全年的 63%。最大冻土层厚度 85cm。

昌平区河流分属三个水系:北运河水系的温榆河;永定河水系的老峪沟;潮白河水系的黑山寨沟。全区平原河道主要属于北运河水系的温榆河,有主要排洪河道 26 条。此外,清河在昌平区南部界边经过,境内长度 4.8km;京密引水渠自东向西贯穿本区,境内长度 37.15km。温榆河属于北运河水系,是海河流域四大河流之一,是北京市西北部地区主要排水河道。河道起自昌平区沙河闸,流经顺义区、朝阳区,至通州北关拦河闸,全长约 48km,流域面积 2478km²。温榆河昌平区段长约 19.4km,境内流域面积 1237km²。项目区附近的水系有蔺沟河。

蔺沟河是温榆河主要支流之一,发源于昌平区东北部山区和怀柔西部山区,上游支流河道主要有牤牛河、白浪河、桃峪口沟(下游秦屯河)、钻子岭沟(下游沙沟河)、西峪沟(下游肖村河)、八家沟、葫芦河等。干流河道起点为葫芦河与沙沟河交汇处,终点汇入温榆河,长度约为3.6公里,总流域面积约为404平方公里,其中昌平境内流域面积约为206.5平方公里。从沙沟河入河口处至蔺沟河拱桥段,在2000年曾进行过治理,治理标准为20年一遇洪水设计,治理长度约为3.2公里,河道上口宽约为65~80米。20年一遇洪水水位为30.62m,常水位为29.00m。

### 1.1.2.2 土壤植被

### (1) 植被状况

该项目建设区内部现有植被主要是果树,果树有苹果树、梨树和葡萄树,主要以梨树为主,植被覆盖率约90%。

### (2) 土壤状况

项目建设区内土壤类型主要为褐土,占项目区85%的土壤。

### 1.1.2.3 侵蚀类型及容许土壤流失值

项目区属于平原区,地势平缓,土层深厚,降雨主要集中于夏季,雨季可能会造成一定程度的水土流失,以水蚀为主。根据 2015 年北京市水土保持公报,项目所在地水土流失强度属微度水力侵蚀,项目区土壤侵蚀背景值 200t/(km²·a),土壤容许流失量为 200t/(km²·a)。

#### 1.1.2.4 国家(省级)防治区划

小汤山镇再生水厂位于北京市昌平区东部小汤山镇,根据《北京市水土保持规划》(2017年5月),项目区属于北京市水土流失重点预防区。根据《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008)5.0.2条的规定,确定本项目的水土流失防治标准执行等级为一级标准。

# 1.2 水土流失防治工作情况

### 1.2.1 水土保持管理

昌平区镇级污水处理设施建设运营项目小汤山镇再生水厂一期工程水土保持工作主要由中节能燕龙(北京)水务有限公司工程部负责,主要工作为:协助

北京市昌平区水土保持工作站对本工程的监督检查,管理参建各方做好本工程水 土流失防治工作,定期召开水土保持工作专项会议,探讨工作中的水土保持问题 并协商解决,做到水土保持工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 做好本工程水土流失防治工作。

### 1.2.2 水土保持方案编报

2014年3月,建设单位中节能燕龙(北京)水务有限公司委托北京北林丽景生态环境规划设计院有限公司编制《昌平区镇级污水处理设施建设运营项目小汤山镇再生水厂一期工程水土保持方案报告书》。方案编制单位于2014年3月底完成了《昌平区镇级污水处理设施建设运营项目小汤山镇再生水厂一期工程建设项目水土保持方案报告书(送审稿)》。2014年4月29日北京市昌平区水务局在昌平区小汤山镇召开了《昌平区镇级污水处理设施建设运营项目小汤山镇再生水厂一期工程建设项目水土保持方案报告书(送审稿)》专家评审会,北京北林丽景生态环境规划设计院有限公司认真修改完善后,完成了《昌平区镇级污水处理设施建设运营项目小汤山镇再生水厂一期工程建设项目水土保持方案报告书(报批稿)》。

2014年7月14日,建设单位取得关于《昌平区镇级污水处理设施建设运营项目小汤山镇再生水厂一期工程水土保持方案报告书》的批复(昌水行许字[2014]61号)。

### 1.2.3 水土保持监测成果报送

2016年4月,建设单位委托我公司开展本项目水土保持监测工作,接受委托时项目已开工9个月,主体工程土方开挖已完成,正在进行主体结构施工。

2016年4月10日,第一次进场调查,了解现场布局及施工进度情况,编制本工程监测实施方案并及时报送至北京市昌平区水土保持工作站;

2016年4月~2017年8月,为施工期监测,每季度初向北京市昌平区水土保持工作站上报上季度监测季报,共报送监测季报6份,监测年报1份;

2017年8月~2019年3月,为自然恢复期监测,共报送监测季报7份,监测年报2份:

2019年4月,工程具备水土保持验收条件,开始编制监测总结报告。

# 1.3 监测工作实施情况

2016年4月,建设单位委托我公司负责本工程水土保持监测工作,接受委托后,我公司立即组织相关技术人员对水土流失防治责任范围内的水土流失情况、水土保持措施实施情况、植被恢复情况进行一次全面的巡查监测,并对水保措施的布设情况,土方调运情况等进行回访调查。

# 1.3.1 监测项目部及人员组成

为保证项目圆满完成,本项目采取总工程师负责制,由总工程师对项目全权负责。本项目监测工作具体人员和分工见下表:

表 1.3-1

监测部组成表

姓 名	职 称	上岗证号	分工
杨怀值	高 工	水保监岗证第(3534)号	总监测工程师
张 薇	工程师	水保监岗证第(3528)号	水土保持措施监测
吴 楠	工程师		防治效果监测
王 克	助工		水土流失因子监测

# 1.3.2 监测点布设及监测方法

根据水土保持方案报告结合现场实际情况,本项目共计布设监测点 5 个,建筑物区、道路硬化及管线区、绿化区、临时堆土场区及施工生产生活区各布设 1 个定位监测点,其余位置采用调查巡查监测,大雨天气加测。

表 1.3-2

监测点布设情况表

点号	监测方法	监测内容	位置
1#监测点	定位监测	监测土建施工扰动地表面积、弃土量、水土流失量、水土保持措施布设情况及水土保持措施防治效果等	建构筑物工程区
2#监测点	定位监测	监测道路区临时防护措施布设情况 及防治效果	道路管线区
3#监测点	定位监测	主要调查水土流失的状况及植被的 破坏和恢复情况	绿化区
4#监测点	定位监测	监测施工期临时堆土产生的水蚀量, 以及临时防护措施布设情况以及防 护效果	临时堆土场区
5#监测点	定位监测	监测施工期产生的水蚀量,以及临时 防护措施布设情况以及防护效果	施工生产生活区

# 1.3.3 监测阶段成果

2016 年 4 月, 我单位接受建设单位委托之后,立即组建了监测项目部,由专业的水土保持监测人员对本项目施工过程进行实时监测,监测过程中遇到问题及时反馈至建设单位和施工单位,并定期向水行政主管部门提交本项目水土保持监测季度报告和监测年报。

自监测人员入场以来,共计完成监测实施方案 1 份,监测季度报告 13 份, 监测年报 3 份,并全部报送至北京市昌平区水土保持工作站。

### 1.3.4 监测意见及落实情况

水土保持监测工作开展期间,每次现场监测后,监测工程师将现场问题及整改意见及时反馈至建设单位管理人员,每季度问题作为监测季度报告的一个章节以书面形式进行记录。

### (1)2016年

2016年第二季度,雨后进行监测,发现现场部分开挖土方未及时苫盖。





现场苫盖不全(2016.6)


2016 年第三季度,建设单位对临时堆土进行了补充苫盖,但季度末管线施工区域土方苫盖不完全,雨后发生轻微的水土流失,建议建设单位雨季加强对现场临时措施运行情况的巡查与管理,确保安全度汛。





加强对临时堆土苫盖(2016.7)







局部土壤流失(2016.9)


2016 年第四季度,建设单位对厂区内所有裸露区域进行了苫盖,部分区域实施了植物措施,本季度主要建议为:加强冬季植物的养护工作,春节放假期间提前对场内道路进行清扫。





裸露区域全部进行苫盖(2016.11)





裸露区域全部进行苫盖(2016.11)

### (2) 2017年

第一季度,施工时间主要集中在3月份,部分管线的施工,现场监测发现,现场苫盖情况较好,但检查井井盖打开且未设置安全标识,存在安全隐患,已现场建议施工单位关闭井盖。





检查井井盖打开 (2017.3)

第二季度,主要进行厂区绿化施工,乔灌木栽植,现场存在问题为绿地未按 照水保方案设计要求进行下凹式绿地整地,灌溉管线施工未及时进行苫盖。现场 已告知业主单位要求施工单位按设计要求进行整改,现场增加防尘网苫盖。



绿地未按照下凹式标准施工(2017.4)




灌溉管线施工未苫盖

第三季度,按照设计要求,施工单位对绿地进行下凹式整地,整改完成基本符合下凹式绿地标准,7月铺草皮,8月绿化全部完成,人行步道进行透水砖铺装施工。工程竣工进入自然恢复期。





植被生长情况(2017.7)





人行道透水铺装及草皮绿化(2017.8)



透水铺装 (2017.8)

2017年第四季度,项目进入自然恢复期,监测主要工作为植被的养护情况、透水铺装及蓄水池运行情况。

自然恢复期内,施工单位加强对植被的养护工作,对枯死植被进行更换; 雨水调蓄池雨天之前将其放空,确保其正常运行。项目区植被长势良好,透水砖及蓄水池均无损坏,水土保持效果良好。

# 1.3.5 重大水土流失危害事件及处理情况

根据现场监测情况,本工程建设过程中未发生过重大水土流失危害事件。

# 2 监测内容与方法

# 2.1 监测内容

依据已审批的水土保持方案报告中确定的监测内容并结合现场实际情况,确定主要监测内容为主体工程建设进度、项目建设扰动土地面积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、重大水土流失事件、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果、水土保持工程设计及变更情况、水土保持管理情况的监测。

# 2.1.1 主体工程进度监测

跟踪主体工程建设进度,了解主要工程的开工日期、实施进度、施工时序,各施工工期的土石方量,工程完工日期等,确保水土保持工程与主体工程同时实施,同时投入使用。

### 2.1.2 项目建设扰动土地面积监测

本工程的防治责任范围主要是项目建设区和直接影响区。主要监测项目开工后不同时期的施工扰动土地面积,各施工期的扰动地表面积和位置随工程进展有一定的变化,应记录其随项目进展的变化。

# 2.1.3 水土流失灾害隐患

对可能发生重大水土流失灾害的区域,如临时堆土区等进行调查监控,注意可能发生严重灾害的各种迹象,提前预测,提前提出建议和预防措施。

# 2.1.4 水土流失及造成的危害监测

施工中根据不同的施工作业对扰动后的地貌进行监测,施工完毕后根据地貌、植被恢复的情况进行监测,计算水土流失的变化量。对施工期发生的重大水土流失事件进行监测。

监测工程建设和运行初期在汛期、大风扬沙季节水土流失程度的发展及其对下游和周边河道、水体影响与危害。

对重大水土流失事件进行监测,重大水土流失事件发生后1周内完成监测。

# 2.1.5 水土保持工程建设情况监测

主要监测工程措施、植物措施、临时措施实施进度、工程量、工程质量、运行效果等。

### 1、工程措施

表土剥离及回填、下凹式绿地整地、土地整治、节水灌溉、沉淀池、500m<sup>3</sup> 蓄水池、透水砖铺装等分布面积、效果的监测。

#### 2、植物措施

监测绿化区域植物措施类型(灌木、乔木、草本等)、植物种类、分布、面积。

### 3、临时措施

密目网拦挡、防尘网苫盖、洒水降尘、临时排水沟、临时沉沙池、临时透水铺装、临时嵌草砖铺装、编织袋拦挡、临时洗车槽、临时堆土撒播草籽等措施实施时间、数量及运行情况监测。

### 2.1.6 水土流失防治效果监测

### 1、防护效果

监测灌溉工程、植物措施工程、在灌溉绿化、减少水土流失、绿化美化生态环境的作用大小。

2、植物措施的成活率、保存率、生长情况及覆盖度。

监测水土保持工程实施后各防治分区及其周边的植被类型、主要树种、盖度、成活率、保存率等。

- 3、透水砖铺装工程的运行情况
- 监测透水砖铺装是否有损坏、沉降等不稳定情况出现。
- 4、各项措施的拦渣保土效果

监测各项措施实施后的拦渣率。

### 2.1.7 水土保持工程设计情况监测

监测水土保持设计变更和优化情况,临时占地防治区的数量、位置、防治措施发生变化后的设计变更和备案情况。

# 2.1.8 水土保持管理

建设单位、施工单位、监理单位的水土保持管理情况(领导部门、管理部门、管理职责、规章制度),水土保持工程档案情况。向水行政主管部分备案项目开工情况。各级水行政主管部门监督检查情况等。

# 2.2 监测指标和方法

# 2.2.1 地形地貌与地面组成物质调查方法

地形地貌采用调查监测的方法,调查指标包括地貌类型、微地形以及地面坡 度组成,并对监测分区进行验证。

地面组成物质通过查阅地质勘察资料,了解其分布范围、面积和变化情况。

### 2.2.2 植被调查方法

植被调查内容包括林草植被的分布、面积、种类、生长情况等指标。通过调查计算林草覆盖度等,采用调查监测的方法。

具体调查方法是:统计法、样方法。

### 2.2.3 水土保持设施及其质量

水土保持设施包括水土保持工程措施、植物措施,还包括自然形成的具有水土保持功能的林草、拦挡物等,采用调查监测的方法确定项目区内水土保持措施的数量及其质量。

## 2.2.4 水土流失状况监测方法

水土流失状况监测包括调查土壤侵蚀的形式、土壤侵蚀强度、土壤侵蚀面积、土壤侵蚀量、采用调查监测方法进行监测。

建设项目土壤流失量根据每月实际监测结果,经整理分析后得出。监测人员依据监测施工过程中采取的各类水土保持措施的种类、数量,并咨询专家,结合文献及北京市水土保持公报等,综合确定工程建设扰动土壤侵蚀模数等参数。

# 2.2.5 水土流失危害

水土流失危害监测包括对项目区范围内的危害和项目周边的危害两方面的监测。对项目区的危害监测着重调查降低土壤肥力和破坏地面完整。对河流下游的危害监测着重调查是否造成加剧洪涝灾害和泥沙淤积。

# 3 重点部位水土流失动态监测

# 3.1 防治责任范围监测

### 3.1.1 水土流失防治责任范围

### (1) 水土保持方案报告确定的防治责任范围

根据批复的水土保持方案报告,本项目水土流失防治责任范围为 8.03hm²,其中项目建设区 7.79hm²,直接影响区 0.24hm²。

### (2) 监测的防治责任范围

通过航天遥感地图测定结合现场监测情况,确定工程建设过程中实际发生的防治责任范围面积为 7.34hm²,其中项目永久占地 6.19hm²全部扰动,项目区西侧临时占地作为临时施工生产生活区,占地约 1.15hm²,项目红线修建文明墙进行围挡,工程建设施工均在批复的红线范围内,无直接影响区。

### (3) 防治责任范围对比情况

本工程实际扰动土地面积与水土保持方案报告确定的防治责任范围进行比较,结果如下表所示:

		防治责任范围(hm <sup>2</sup> )								
ــد		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \								
序	工程分区	方案i	没计	监测	结果	增减	情况			
号	工作为区	项目	直接	项目	直接	项目	直接			
		建设区	影响区	建设区	影响区	建设区	影响区			
1	建构筑物工程区	2.44		2.44		0				
2	道路硬化面及管线区	1.43		1.20		-0.23	-0.24			
3	绿化工程区	2.32	0.24	2.55	0	+0.23				
4	临时堆土防治区	1.34		0		-1.34				
5	施工生产生活区	0.26		1.15		+0.89				
	合 计	7.79	0.24	7.34	0	-0.45	-0.24			

表 3.1-1 水土保持方案确定防治责任范围与实际防治责任范围对比表

经过对比,项目实际防治责任范围较水土保持方案确定的水土流失防治责任减少了 0.69hm², 主要变化原因是项目建设过程中均在一期红线范围内施工,未对原设计直接影响区进行扰动;未占用水土保持方案设计在二期用地范围内的临时堆土区;施工生产生活区位于位于项目区西侧,不属于原水保方案规划施工生产区。

# 3.1.2 建设期扰动土地面积

本工程于2015年7月开工建设,2017年8月完工。根据工程建设进度,监测工程师截取了工程建设前、建设初期、建设中期、建设后期项目区卫星遥感影像图,认真分析各阶段项目区扰动土地情况。

### (1) 建设前



工程建设前卫星遥感图(来源于 Google earth 2015年4月拍摄)

2015年4月,各参建单位尚未进场,现状占地大部分为农业用地,扰动土地面积为0。

# (2)建设初期



工程建设初期卫星遥感图 (来源于 Google earth 2015年9月拍摄)

2015年9月,施工生产生活区部分已搭建完成,项目区进行场地清表工作, 开挖土方临时堆放于项目区内。本阶段扰动土地面积为 7.34hm²,包括建设区 6.19hm²,施工生产生活区 1.15hm²。

# (3)建设中期



工程建设中期卫星遥感图 (来源于 Google earth 2016年3月拍摄)

2016年3月,施工生产生活区已搭建完成,主体工程基础基本完成,已完成肥槽回填,剩余部分土方堆放于项目区内用于后期绿化覆土。本阶段扰动土地面积为7.34hm²,包括建设区6.19hm²,施工生产生活区1.15hm²。

### (4)建设后期



工程建设后期卫星遥感图(来源于Google earth 2017年8月拍摄)

2017 年 8 月,绿化施工完成,工程竣工,施工临建已拆除复绿并交还至土地所属单位。本阶段扰动土地面积为 7.34hm²,包括建设区 6.19hm²,施工生产生活区 1.15hm²。

# 3.2 取土 (石、料) 监测结果

本工程除临时堆土外不另设取土(石、料)场,故不涉及取土(石、料)场 的监测。

# 3.3 弃土 (石、渣) 监测结果

# 3.3.1 设计弃土 (石、渣)情况

根据批复的水土保持方案,本工程弃渣总量为 125m³, 主要为建筑垃圾和施工过程中产生的施工垃圾, 弃渣运往利昌环境卫生服务中心阿苏卫渣土消纳场进行消纳。

# 3.3.2 弃土 (石、渣)场位置及占地面积监测结果

通过咨询施工单位,本工程实际施工过程中产生的建筑垃圾全部运输至利昌 环境卫生服务中心阿苏卫渣土消纳场进行消纳利用,余方堆放红线用地范围内堆 放,未单独设置弃土(石、渣)场。

# 3.3.3 弃土 (石、渣)量监测结果

通过查看施工单位上报的施工资料及现场勘查,施工前土地占地类型为果园,高程在32.5m~33.5m之间,施工结束后厂区平均高程为34.5m。工程建设实际开挖土方量与水土保持方案报告中确定的土石方量进行比较分析,结果如下:

表 3.3-1

### 土石方情况监测表

单位: 万 m<sup>3</sup>

分区	方案设计		监测结果			增减情况			
<b>ガム</b>	开挖	回填	弃方	开挖	回填	弃方	开挖	回填	弃方
建构筑物区	11.36	1.27		12.65	1.56	4.94	+1.29	+0.29	+4.94
道路硬化面及管线工程区	2.51	3.32		2.51	3.31			-0.01	
绿化工程区	0	9.28		0.69	6.04		+0.69	-3.24	
施工生产生活区	0.08	0.07	0.01	0.35	0.35		+0.27	+0.28	-0.01
合 计	13.95	13.94	0.01	16.20	11.26	4.94	+2.25	-2.68	+4.93

经对比分析,施工过程实际挖方量与水土保持方案报告预测值相比发生变化,实际挖方较设计增加 2.25 万 m³, 填方较设计减少 2.68 万 m³, 弃方较设计增加 4.93 万 m³, 变化较大,但整体控制在水土保持方案变更允许范围内,属于工程施工合理变化,工程土方施工较为合理。

# 4 水土流失防治措施监测结果

根据《水土保持监测实施方案》制定的监测计划,针对不同分区的监测内容和监测指标,采用合理的监测方法对工程措施、植物措施进行定期调查和量测。

### 4.1 工程措施监测结果

采用调查监测的方法对主体工程中具有水土保持功能的工程措施进行调查 监测,对水土保持方案报告中设计的工程措施进行重点监测,并通过实地量测等 方法进行现场监测。工程措施实施情况如下所述。

### 4.1.1 工程措施设计情况

### 1、建构筑物工程防治区

(1) 表土剥离

建构筑物工程区占地类型主要为果园 2.44hm<sup>2</sup>。果园土质比较好,表土层比较厚, 剥离厚度可按 30cm 考虑, 剥离面积 2.44hm<sup>2</sup>, 剥离土方为 0.73 万 m<sup>3</sup>。

### 2、道路硬化及管线工程防治区

(1) 表土剥离

考虑到施工后期道路硬化面及管线工程区要进行硬化处理,为保护表土资源,方案设计对道路硬化面及管线工程区占地范围内的表土进行剥离。本工程区占用果园用地 1.31hm², 农村道路为 0.12hm²; 果园剥离厚度按 30cm 考虑,剥离量为 0.39 万 m³。

(2) 地面停车场植草砖铺装

地上机动停车场采用植草砖铺装,一共12个车位,每个车位规格为3m×6m,铺装面积共计0.02hm<sup>2</sup>。

(3) 透水砖的铺装

人行道和建筑周围入口及广场铺设透水砖 0.67hm²。

#### 3、绿化工程防治区

(1) 表土回填

该区绿化面积共计 2.32hm²,设计在绿化前对该区进行表土回覆,回覆表土量 1.20 万 m³,平均回覆厚度约 0.50m。

(2) 下凹式绿地土地平整

根据项目地形,整体平坦,项目区设计下凹式绿地约为项目绿地的 70%,设计占地面积为 1.62hm²,下凹式绿地应低于周边区域 10cm,用以下渗吸收绿地周边硬化面雨水。

### (3)集雨池

本项目区内径流总量通过下凹式绿地下渗之后剩余径流 378.21m³,综合考虑设置 500m³集雨池 1 座对雨水进行收集,集雨池参照《室外给排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(ECS138:2002)和《矩形钢筋混凝土蓄水池》(国家建筑标准设计图集 05S804)进行设计,集雨池设置在绿化区域内,采用地埋式,矩形钢筋混凝土结构。

#### (4) 沉淀池

集雨池的进水口处布置沉淀池,雨水经沉淀池沉淀后排入集雨池。沉淀池为方形,砖砌水泥砂浆抹面,池长 3m,宽 2m,深 2m,池壁厚 0.24m。池体底部设置沙砾垫层,垫层厚 0.1m。沉淀池顶部设置钢筋混凝土盖板并预留清淤口,盖板厚 10cm,清淤口设置 600mm 铸铁井盖。

### (5) 节水灌溉系统

本方案在项目区绿化区域灌溉方式选择喷灌;在满足植物需水量的同时,可以节约大量用水。喷灌系统首部设置在集雨池附近。管道组成主要包括干管和支管二级管道;干管沿绿化区中心线布设,长度根据植物树种的情况进行调整,灌溉系统布置 2 条干管。

### 4、施工生产生活防治区

### (1) 表土剥离

本项目施工场地占用了 0.26hm² 的果园, 所占用的园地在施工结束后必须进行植被恢复。为了便于后期植被恢复, 场地平整前应根据扰动特点及需要剥离表层耕植土, 耕地剥离厚度 30cm, 剥离方量 780m³。

#### (2) 表土回覆

施工结束后,将保存的表土进行回覆,为植被的生长提供一个适宜的环境,回覆方量为 780m³。

### 4.1.2 工程措施实施情况

### 1、建构筑物工程防治区

### (1) 表土剥离

对项目区内果园用地进行表土剥离,剥离表土回填用于绿化,共计剥离表土 0.54 万 m³。

### 2、道路硬化及管线工程防治区

### (1) 表土剥离

对项目区内果园用地进行表土剥离,剥离表土回填用于绿化,共计剥离表土 0.22 万 m³。

### (2) 植草砖铺装

方案设计地上机动停车场采用植草砖铺装,实际实施过程中,地上停车位采 用透水砖。

### (3) 透水砖铺装

对人行道和建筑周围入口广场铺设透水砖,透水砖铺装面积为 1580m2。

### 3、绿化工程防治区

#### (1) 表土回填

施工后期绿化前对绿化工程防治区进行表上回填,共计表上回填 1.45 万 m³。

### (2) 下凹式整地

施工单位对项目区部分绿地进行下凹式整地,用于收集项目区内的雨水,共 计完成下凹式绿地面积 1.6hm²。

### (3)集雨池

施工单位在绿化区域内设置一座 500m3 集雨池,进行项目区雨水收集利用。

#### (4) 沉淀池

施工单位在集雨池进水口处布置一座沉淀池,雨水经沉淀池沉淀后排入集雨池。

### (5) 节水灌溉工程

本项目绿化区域灌溉方式选择喷灌,设有节水灌溉措施,灌溉系统布置 2 条干管,共计 1697m。

### (6) 表土剥离

对项目区内果园用地进行表土剥离,剥离表土回填用于绿化,共计剥离表土 0.69 万 m³。

### 4、施工生产生活防治区

### (1) 表土剥离

施工单位对占用果园用地的区域进行表土剥离,剥离表土回填用于绿化,共 计剥离  $0.35~\mathrm{ff}~\mathrm{m}^3$ 。

### (2) 表土回覆

施工后期对该区进行植被恢复,植被恢复前进行表土回填,共计表土回填 0.35万 m³。

防治分区	工程措施	完成量	实施时间
建构筑物工程防治区	表土剥离	0.54 万 m <sup>3</sup>	2015.7-2015.8
道路硬化面及管线工程	表土剥离	0.22 万 m <sup>3</sup>	2015.7-2015.8
防治区	透水砖铺装	1580m <sup>2</sup>	2017.7-2017.8
	节水灌溉工程	1套	2016.8-2016.11
	下凹式整地	1.6hm <sup>2</sup>	2016.7-2017.9
绿化工程防治区	表土回覆	1.45 万 m <sup>3</sup>	2016.7-2017.8
	500m³集雨池	1座	2015.9-2015.10
	沉淀池	1座	2015.9-2015.10
施工生产生活防治区	表土剥离	0.35 万 m <sup>3</sup>	2015.7-2015.8
他上生) 生怕切怕区	表土回覆	0.35 万 m <sup>3</sup>	2016.7-2017.8

# 4.1.3 工程措施监测结果

实际施工阶段,建设单位基本能够按照水土保持方案报告的设计要求落实工程措施,主要变化体现在:①绿化区方案未考虑表土剥离,实际实施过程中导致表土剥离工程量增加,②原设计清水池附近透水铺装面积部分变为景观绿地导致透水铺装总面积减少。其余措施变化为施工微小变动,水土保持功能体系较方案设计并未减小,符合水土保持要求。

表 4.1-1

# 水土保持工程措施实施工程量表

防治分区	工程措施	単位	设计量	实施量	变化量 (+/-)
建构筑物工程防治区	表土剥离	万 m³	0.74	0.54	-0.20
	表土剥离	万 m³	0.38	0.22	-0.16
道路硬化面及管线工程防治区	植草砖铺装	$m^2$	216	0	-216
	透水砖铺装	$m^2$	6700	1580	-5120
	节水灌溉工程	套	1	1	
	下凹式整地	hm <sup>2</sup>	1.62	1.60	-0.02
绿化工程防治区	表土回覆	万 m³	1.12	1.45	+0.33
% 化工程 的 伯 区 	500m³集雨池	座	1	1	
	沉淀池	座	1	1	
	表土剥离	万 m³	0	0.69	+0.69
施工生产生活防治区	表土剥离	万 m³	0.08	0.35	+0.27
他工生厂生怕忉伯区	表土回覆	万 m <sup>3</sup>	0.08	0.35	+0.27

水土保持工程措施照片





透水砖铺装





节水灌溉系统





集雨池





下凹式绿地整地

# 4.2 植物措施监测结果

植物措施的监测方法主要为实地量测法统计乔灌木的种类及数量,样方法调查植被的成活率,通过竣工平面图及遥感影像图,复核绿化工程区面积。

# 4.2.1 植物措施设计情况

### 1、绿化工程区

绿化工程区共计 2. 32hm², 在植物种类的选择上应遵循以下几个原则:

- (1) 尽量选择当地的乡土树种;
- (2)注意乔灌草结合,尽量通过树种色彩的变化从而产生视觉的变化,如 合欢、国槐等,同时采用常绿树种,如白皮松、大叶黄杨等。
- (3)根据项目区特点,尽量体现项目区生机盎然的一面,设计上不要单一 采用规则式的手法,将规则式与自然式相结合,更能体现项目区的特色。
- (4) 行道树采用国槐和合欢,尽量采用行列式栽植,具有遮荫作用,用大叶黄杨、紫叶小檗等进行点缀,形式上不再单一,富有变化。

### 2、施工生产生活区

在本项目后期对施工生产生活区进行植被恢复,进行撒播种草,面积约为0.26hm²,按照15m²/g,共需39kg。

# 4.2.2 植物措施实施情况

### 1、绿化工程区

绿化美化

施工过程中,施工单位依据施工图设计及招投标合同,采用乔灌草相结合的绿化方式进行美化,实施的化面积共计 2.55hm²,栽植乔木 232 株、灌木 4206株、时令花卉 140m²,草皮 1.5hm²,具体实施情况如下表。本项目绿化施工与管线埋设同步施工,采用分区域施工的方式,因此实施时间较长,实施时间为 2016年 10 月至 2017 年 8 月。

### 2、施工生产生活区

撒播草籽

本项目后期对施工生产生活区进行撒播草籽,面积约 1.11hm²,共计撒播草籽 160kg,实施时间为 2017 年 6 月。

## 4.2.3 植物措施监测结果

实际施工过程中,施工图设计对园林绿化部分进行了高标准设计,增加了苗木种类,改善了生态多样性,因此苗木量等有所调整,因透水铺装部分变更为景观绿地,绿化面积较水保方案设计增加 0.23hm²,植物措施的变化提高了项目区建设完成后的水土保持效益,符合水土保持要求。

表 4.2-1

绿化工程区绿化苗木表

序号	苗木名称	单位	设计工程 量	实际完成工 程量	增减量 (+/-)
1	国槐	株	199	55	-144
2	合欢	株	180	0	-180
3	白皮松	株	20	3	-17
4	雪松	株	14	0	-14
5	樱花	株	33	25	-8
6	紫叶李	株	43	134	+91
7	碧桃	株	50	33	-17
8	银杏	株	2	9	+7
9	花石榴	株	36	76	+40
10	丛生石榴	株	0	76	+76

11	紫薇	株	52	23	-29
12	大叶黄杨	株	929	329	-600
13	小叶黄杨	株	0	3000	+3000
14	连翘	株	344	0	+344
15	金山绣线菊	株	9	0	-9
16	龙柏球	株	32	0	+32
17	金叶女贞	株	180	71	-109
18	紫叶小壁	株	600	0	+600
19	金丝垂柳	株	0	60	+60
20	云杉	株	0	32	+32
21	造型油松	株	0	4	+4
22	丛生蒙古栎	株	0	2	+2
23	丛生元宝枫	株	0	6	+6
24	白腊	株	0	21	+21
25	白玉兰	株	0	17	+17
26	黄栌	株	0	46	+46
27	八棱海棠	株	0	3	+3
28	暴马丁香	株	0	75	+75
29	垂丝海棠	株	0	63	+63
30	山桃	株	0	62	+62
31	山杏	株	0	59	+59
32	红枫	株	0	9	+9
33	丁香	株	0	80	+80
34	金银木	株	0	37	+37
35	榆叶梅	株	0	27	+27
36	天目琼花	株	0	16	+16
37	草皮	hm <sup>2</sup>	0	1.5	+1.5
38	时令花卉	$m^2$	0	140	+140
39	植被恢复	hm <sup>2</sup>	0.26	1.11	+0.85

# 本工程水土保持植物措施照片





花卉栽植





花卉栽植





灌木栽植





乔木栽植





乔木栽植

# 4.3 临时防治措施监测结果

### 4.3.1 临时措施设计情况

### 1、建构筑物工程防治区

(1) 基坑周边密目网围挡

方案设计在建构筑物基坑周边设置钢管及密目网的围挡措施,围挡高度为1m。本项目共设密目网拦挡约2227m,需密目网2227m<sup>2</sup>。

#### (2) 洒水降尘措施

在建设期间多风季节对场区内采用洒水,每日1次(1台时),建设期10个月,根据估算,工程建设期内共计多风天气合计108天,需洒水车108台时。

### 2、道路及其它硬化工程防治区

### (1) 防尘网苫盖

在施工期间,管沟施工开挖土料暂时堆放在管沟一侧,临时用防尘网(L1.8m×6,2000目)进行苫盖。管槽断面为梯形,根据不同的管线挖深不同。堆土断面为梯形,高1.5m,顶宽2.0m,边坡比1:0.5。经计算,每延米堆土断面需密

目网 6m<sup>2</sup>,本区共需防尘网约 19980m<sup>2</sup>。

### (2) 施工出入口清洗凹槽

为防止施工车辆带出泥土影响周边环境,主体设计在施工出入口设置清洗凹槽,凹槽采用混凝土砌筑,长 10m,宽 4m。项目共布置清洗凹槽 1 座,位于项目区西侧的污泥出入口。

### (3) 临时排水沟、沉沙池

施工道路由于大型运输车辆同行扰动剧烈,雨季容易发生沟蚀造成严重的水 土流失,故在施工道路一侧布设临时排水沟,长 1769m。

排水沟末端接临时沉沙池,根据排水沟的断面尺寸和过流能力,临时沉沙池 采用矩形断面,池长 3m,池宽 2m,池深 1.5m,由于施工期稍长,因此沉沙池 采用砖砌水泥抹面,项目建设区内排水沟沿施工道路布置,项目建设区共设置沉 沙池 8 座。

### 3、临时堆土防治区

### (1) 防尘网遮盖

堆土场布置在二期规划用地,总占地面积 1.34hm²,平均堆高 5m。为防止临时堆土裸露期间,扬尘和水土流失的发生,临时堆土采用防尘网进行临时遮盖,防尘网遮盖面积约 14000m²。

### (2) 临时堆土场编织袋拦挡

临时堆土场周边设计编织袋进行拦挡防护,编织袋围埂高 80cm,底宽 60cm;编织袋长 751m,编织袋拦挡填筑、拆除土方 1710.50m³。

### (3) 临时排水沟、沉沙池

方案设计堆土四周开挖土质排水沟长共计 700m。在临时土质排水沟末端设置临时土质沉沙池,池长 2m,宽 1.5m,深 1.5m,共设置 4座。

### 4、施工生产生活防治区

### (1) 临时排水沟、沉沙池

在施工场地周边修建临时排水沟,将雨水顺畅的引入道路排水沟。经估算,需设置简易排水沟约 260m。排水沟选用施工简单且易于后期恢复的简易排水沟,在排水沟末端修建沉沙池,设置沉沙池 2 座。

#### 4.3.2 临时措施实施情况

根据现场监测情况,结合施工资料,本项目临时措施实施情况如下:

#### 1、建构筑物工程防治区

#### (1) 密目网拦挡

施工过程中,基坑大开挖施工需开挖池底,为减少施工期间风蚀,施工单位 采用密目网拦挡,拦挡高度约 1m,共使用密目网 3780m<sup>2</sup>。

#### (2) 洒水降尘

施工期间采用洒水车对项目区施工道路实施洒水措施,以降低扬尘,共计洒水降尘230台时。

#### 2、道路及其它硬化工程防治区

#### (1) 临时排水沟、沉沙池

施工单位在施工道路一侧修建临时排水沟,长 1569m,建设区内产生的汇水通过排水沟排至沉沙池,经沉淀后排入市政管网,项目区内共计修建临时沉沙池 5 座。

#### (2) 防尘网苫盖

施工期间,管道开挖产生的临时堆土暂时堆放在管沟一侧,采用防尘网苫盖, 共计使用防尘网 20490m<sup>2</sup>。

#### (3)车辆清洗槽

施工单位在施工出入口设置清洗凹槽,凹槽采用混凝土砌筑,清洗凹槽一侧设置沉沙池,项目共布置清洗凹槽1座。

#### 3、绿化工程防治区

#### (1) 防尘网苫盖

施工过程中,将原水保方案设计的堆放于二期规划用地的临时堆土,在未施工的绿化工程防治区临时堆放,并采用防尘网苫盖,苫盖面积为14500m<sup>2</sup>。

#### (2)编织袋拦挡

对临时堆放的表土四周进行编织袋围挡,防止因降水发生大规模冲刷,共实施编织袋围挡 800m。

#### (3) 临时排水沟、沉沙池

堆土区四周开挖土质排水沟 720m, 两端分别开挖 2m3 左右的沉沙池。

#### 4、临时堆土防治区

实际施工过程中,临时堆土在项目区绿化工程区内倒运堆放,因此水土保持方案设计的该区域临时措施,布设在绿化工程区。

#### 5、施工生产生活防治区

#### (1) 临时排水沟、沉沙池

施工单位在施工生产生活防治区设置排水沟约 231m, 在排水沟末端修建沉沙池, 布设沉沙池 2 座。

#### (2) 透水砖、植草砖铺装

施工期间,施工单位在施工生产生活区布设了透水砖和植草砖,布设透水砖面积 1945m²,植草砖面积 253m²,施工后期全部拆除。

#### (3) 栽植乔木、灌木

施工期间,施工单位对施工生产生活防治区进行了临时绿化,共计栽植乔木 54 株、灌木 218 株,施工后期进行移栽至项目区内。

表 4.3.1 水土保持临时措施实施进度表

工程分区	措施类型	完成量	实施时间	拆除时间
建构筑物工程防治	密目网苫盖	3780m <sup>2</sup>	2015.8-2016.7	2017.4
区	洒水车洒水	230 台时	2015.7-2017.6	/
	临时排水沟	1569m	2015.7-2015.9	2016.10
道路及其它硬化工	临时沉沙池	5座	2015.7-2015.9	2016.10
程防治区	防尘网苫盖	20490m <sup>2</sup>	2015.8-2016.6	2016.9
	车辆清洗槽	1座	2015.7	2017.7
	防尘网苫盖	19600m <sup>2</sup>	2015.8-2017.4	2017.5
绿化工程区(临时	编织袋拦挡	800m	2015.7-2015.10	2016.5
堆土)	临时排水沟	720m	2015.8	2016.5
	临时沉沙池	2座	2015.8	2016.5
	透水砖铺装	1945m <sup>2</sup>	2015.7-2015.10	2017.7
	植草砖铺装	253m <sup>2</sup>	2015.7-2015.10	2017.7
施工生产生活防治	临时排水沟	231m	2015.7-2015.9	2017.7
区	临时沉沙池	2座	2015.7-2015.9	2017.7
	栽植乔木	54 株	2015.7-2015.10	2017.5
	栽植灌木	218 株	2015.7-2015.10	2017.5

## 4.3.3 临时措施监测结果

实际施工过程中,临时措施的变化主要体现在以下几个方面: ①水保方案中设计工期仅为 10 个月,实际施工工期为 25 个月,导致防尘网苫盖、洒水降尘措施增加②施工单位对施工临建区建造标准提高,增加了透水铺装及绿化措施③水保方案设计临时堆土区实际施工中未进行扰动,实际临时堆土位于项目绿化工程区内,方案中临时堆土区的措施实施在绿化工程区内。调整后实施的水土保持临时措施有效的减少了因施工产生的新增土壤流失量,符合水土保持要求。

表 4.3-2 水土保持临时措施实施工程量表

工程分区	措施类型	单位	设计工程量	实施工程量	增减量 (+/-)
建构筑物工程防	密目网拦挡	$m^2$	3320	3780	+460
治区	洒水降尘	台时	108	230	+122
	临时排水沟	m	1769	1569	-200
道路及其它硬化	临时沉沙池	座	7	5	-2
工程防治区	防尘网苫盖	$m^2$	19980	20490	+510
	车辆清洗槽	座	1	1	0
	防尘网苫盖	m <sup>2</sup>	0	19600	+19600
绿化工程防治区	编织袋拦挡	m	0	800	+800
(临时堆土)	临时排水沟	m	0	720	+720
	临时沉沙池	座	0	2	+2
	临时排水沟	m	700	0	-700
	临时沉沙池	座	4	0	-4
临时堆土防治区	编织袋挡土墙	m	684	0	-684
	撒播草籽	kg	201	0	-201
	防尘网苫盖	m <sup>2</sup>	14000	0	-14000
	透水砖铺装	m <sup>2</sup>	0	1945	+1945
	植草砖铺装	m <sup>2</sup>	0	253	+253
施工生产生活防	临时排水沟	m	260	231	-29
治区	临时沉沙池	座	2	2	0
	栽植乔木	株	0	54	+54
	栽植灌木	株	0	218	+218

#### 水土保持临时措施照片





## 4.4水土保持措施防治效果

项目水土保持措施实际完成量与批复的水保方案相比,各防治分区工程量均有所调整,或增加,或减少。除建构筑物外,道路及广场采取了硬化及透水铺装,绿地已全部进行林草植被覆盖,目前,项目区无土地裸露区域,水土流失得到全面治理,水土流失总治理度达到100%。

实施的工程措施透水砖无破损、蓄水池及灌溉管线正常运行;植物措施生长情况良好,林草恢复率达100%,成活率在97%以上;临时措施排水沟、沉沙池、苫盖、洒水降尘等措施施工期间运行正常,减少了因大风大雨天气引起的风蚀、水蚀等,对项目整体水土保持工作具有积极意义。

表 4.4-1 水土保持措施监测汇总表

防治分区	措施类型	措施名称	单位	方案设计量	实际实施量
	工程措施	表土剥离	万 m³	0.74	0.54
建构筑物工程防治区	<b>水叶井</b>	密目网拦挡	m <sup>2</sup>	3320	3780
	临时措施	洒水降尘	台时	108	230
		表土剥离	万 m³	0.38	0.22
	工程措施	植草砖铺装	$m^2$	216	0
送购两小五五签外工		透水砖铺装	$m^2$	6700	1580
道路硬化面及管线工 程防治区		临时排水沟	m	1769	1569
住协行区	临时措施	临时沉沙池	座	7	5
	<b>他</b> 的 有 他	防尘网苫盖	m <sup>2</sup>	19980	20490
		车辆清洗槽	座	1	1
	工程措施	节水灌溉工程	套	1	1
		下凹式整地	hm <sup>2</sup>	1.62	1.60
		表土回覆	万 m³	1.12	1.45
		500m³集雨池	座	1	1
		沉淀池	座	1	1
绿化工程防治区		表土剥离	万 m³	0	0.69
	植物措施	绿化美化	hm <sup>2</sup>	2.32	2.85
		防尘网苫盖	m <sup>2</sup>	0	19600
	临时措施	编织袋拦挡	m	0	800
	<b>他</b> 的 有 他	临时排水沟	m	0	720
		临时沉沙池	座	0	2
		临时排水沟	m	700	0
临时堆土区	临时措施	临时沉沙池	座	4	0
		编织袋挡土墙	m	684	0

#### 4水土流失防治措施监测结果

		撒播草籽	kg	201	0
		防尘网苫盖	m <sup>2</sup>	14000	0
	工程措施	表土剥离	万 m³	0.08	0.35
	<b>上任</b> 有他	表土回覆	万 m³	0.08	0.35
	植物措施	撒播草籽	kg	39	160
	临时措施	透水砖铺装	$m^2$	0	1945
施工生产生活防治区		植草砖铺装	m <sup>2</sup>	0	253
		临时排水沟	m	260	231
		临时沉沙池	座	2	2
		栽植乔木	株	0	54
		栽植灌木	株	0	218

# 5 土壤流失情况监测

# 5.1 水土流失面积

水土流失面积根据现场监测资料,结合施工资料及影像资料分析后得出。本工程建设期为2015年7月~2017年8月,经调查统计,施工期因工程建设造成水土流失面积为7.34hm²。

根据现场监测数据,结合本工程水土保持方案报告中的预测结果,确定本工程建设过程中水土流失主要时段为施工期,发生水土流失主要区域为建构筑物工程区、道路硬化面及管线工程区及绿化工程区内临时堆土区域,与报告预测值基本一致。

工程建设水土流失面积见下表。

表 5.1-1

工程建设期水土流失面积表

序号	防治分区	水土流失面积(hm²)	备注
1	建构筑物工程区	2.44	基坑开挖容易形成一定的开挖裸 露面和临时堆土
2	道路硬化面及管线工程区	1.20	管线、路基的开挖等施工
3	绿化工程区	2.55	绿化土地整治、临时堆土存放等
4	临时堆土区	0	
5	施工生产生活区	1.15	场地的清理、平整
合计		7.34	

本工程自然恢复期为 2017 年 8 月至 2019 年 3 月,调查统计,自然恢复期水 土流失面积为绿化区面积 2.55hm²,产生的水土流失类型主要为降雨对土壤产生 的冲刷。

# 5.2 土壤流失量

建设项目土壤流失量根据每月实际监测结果,经整理分析后得出。监测人员 依据施工过程中采取的各类水土保持措施的种类、数量,结合文献及北京市水土保持公报等,综合确定工程建设扰动土壤侵蚀模数。

表 5.2-1

本项目监测期土壤流失量汇总表

监测时段	水土流失量(t)	土壤侵蚀模数(t/ (km².a))	备注
2016 年第二季度	33.24	1811.44	
2016 年第三季度	36.80	2005.45	施工期
2016 年第四季度	28.51	1553.68	

	;		
2017 年第一季度	25.33	1380.38	
2017 年第二季度	16.52	900.27	
2017 年第三季度	2.65	415.26	
2017 年第四季度	1.85	289.92	
2018 年第一季度	1.51	237.60	
2018 年第二季度	1.27	198.91	自然恢复期
2018 年第三季度	1.24	195.10	日松饮麦州
2018 年第四季度	1.21	189.10	
2019 年第一季度	120	188.56	
总计	151.33		

批复的水土保持方案报告中预测的水土流失总量 292.88t (其中建设期 268.18t,自然恢复期 24.70t),新增的水土流失量为 263.76t (其中建设期 254.75t,自然恢复期 9.02t)。

根据监测结果统计结果,本项目实际土壤流失量为 151.33t(其中建设期 140.40t,自然恢复期 10.93t)。土壤流失总量较水土保持方案预测减少 141.55t(其中建设期减少 127.78t,自然恢复期减少 13.77t)。

随着主体工程完成和水土保持措施的实施,土壤流失量逐渐减少,说明施工过程中,水土保持措施的实施有效减少了水土流失量,进一步证实了采取水土流失防治措施的必要性。主体工程与水土保持工程同时施工,随着水土保持各项措施的实施,土壤流失量明显减少。

# 5.3 取土 (石、料) 弃土 (石、渣) 潜在水土流失量

本工程除临时堆土外不另设取土(石、料)场,未单独设置弃土(石、渣)场。故不涉及取土(石、料)及弃土(石、渣)场的监测。

# 5.4 水土流失危害

本工程建设施工过程中,施工单位采取各种水土保持措施,对可能产生水土流失的地区进行防范和治理,临时堆土进行苫盖,不在大风、雨天施工,采用成熟的施工工艺,对可绿化区域进行全面绿化,避免二次扰动,施工过程中未发生水土流失危害事件,未对周边事物造成不利的影响。

# 6 水土流失防治效果监测

目前,本工程已完工,水土保持工程措施已经完工,临时措施已拆除,植物措施已经实施。从 2017 年 9 月开始,项目进入植被恢复期。针对工程建设期的水土流失监测,计算水土流失防治指标。并对项目区实施水土流失防治措施的效果进行分析,评价水土流失防治状况。

## 6.1 开发建设项目水土流失防治指标

#### 6.1.1 扰动土地整治率

根据《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008), 扰动土地整治率=(水土保持措施防治面积+永久建筑物+硬化面积)/扰动土地总面积。

本项目工程建设期扰动土地面积为 73400m², 扰动土地整治面积 73400m², 经计算本项目扰动土地整治率达到 100%, 满足方案确定 95%的防治目标。

各防治分区扰动土地治理包括实施的工程措施和植物措施。林草植物措施为项目区的绿化美化。各防治分区扰动土地整治率计算结果见下表。

		扰动土地				
防治分区	扰动	林草	工程	建筑物	合计	
	面积	措施	措施	及硬化	7	正和十(70)
建构筑物工程区	24400	0	0	24400	24400	100
道路硬化面及管线区	12000	0	1580	10420	12000	100
绿化工程区	25500	25500	0	0	25500	100
施工生产生活区	11500	11100	0	400	11500	100
合计	73400	26600	1580	35200	73400	100

表 6.1-1 各防治分区扰动土地整治率统计表

#### 6.1.2 水土流失总治理度

根据《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008),水土流失总治理度=水土流失治理达标面积/水土流失总面积。

工程建设所扰动部位均采取相应的治理措施,工程建设造成水土流失面积为73400m²,水土流失总治理达标面积达73400m²。因此,工程施工结束后,水土流失总治理度计算值为100%,达到防治目标(95%)。

表 6.1-2 各防治分区水土流失总治理度统计表

		治理达	标面积	$(m^2)$		水土流失
防治分区	水土流失	林草	工程	建筑物	合计	总治理度(%)
	面积	措施	措施	及硬化	ΡV	心相程及(70)
建构筑物工程区	24400	0	0	24400	24400	100
道路硬化面及管线区	12000	0	1580	10420	12000	100
绿化工程区	25500	25500	0	0	25500	100
施工生产生活区	11500	11100	0	400	11500	100
合计	73400	26600	1580	35200	73400	100

#### 6.1.3 拦渣率与弃渣利用情况

根据《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008), 拦渣率=采取措施实际拦挡的弃土(石、渣)量/工程弃土(石、渣)总量。

本工程挖方主要来源于建构筑物工程区、道路硬化面及管线区及绿化工程区等。经统计,本工程土方挖填总量为 27.46 万 m³, 其中挖方总量 16.2 万 m³, 填方总量为 11.26 万 m³, 项目区回填土方临时堆置在暂时不施工区域,临时堆土采用防尘网临时覆盖,防护情况良好。弃方总量为 4.94 万 m³ (含拆除建筑垃圾产生弃渣 0.3 万 m³),全部运往利昌环境卫生服务中心阿苏卫渣土消纳场。

施工过程中,合理进行土方调配,使项目土方充分利用。考虑施工过程中土方转运洒落情况,经计算,项目土石方拦渣率为99%,达到防治目标(95%)。

# 6.1.4 土壤流失控制比

根据《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008),土壤流失控制比=容许土壤流失量/方案实施后土壤侵蚀强度。其中,方案实施后土壤侵蚀强度是指项目区平均土壤侵蚀模数。

目前工程已经完工,并进入自然恢复期,现场绿化措施均实施到位,植物措施生长良好,基本没有水土流失情况。土壤流失控制比=200/189=1.06,经计算,土壤流失控制比为1.06。

# 6.1.5 林草植被恢复率

根据《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008), 林草植被恢复率=林草类植被面积/可以采取植物措施的面积。

本工程施工后期,对扰动的绿化区域植被恢复,工程建设区内可绿化面积为

2.55hm<sup>2</sup>,实际恢复植被面积 2.55hm<sup>2</sup>。经计算,本工程林草植被恢复率为 100%。

#### 6.1.6 林草覆盖率

根据《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008), 林草植被恢复率=林草类植被面积/项目建设区面积。

本工程恢复林草植被面积 2.55hm², 项目建设面积为 6.19hm², 经计算, 本工程林草覆盖率为 41.2%。

项目达标情况:综上可知,本项目建设过程中采取了一系列的水土保持措施,项目建设区扰动土地整治率为 100%,水土流失总治理度为 100%,土壤流失控制比为 1.06,拦渣率为 99%,林草植被恢复率为 100%,林草覆盖率为 41.2%,六项防治指标均达到《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008)确定的一级防治目标。

### 6.2 北京市房地产项目水土流失防治指标

报告在分析计算标准的六项指标的同时,对北京市房地产项目水土流失防治标准中的五项指标进行计算,结果如下:

#### 6.2.1 土石方利用率

土石方利用率指项目建设过程中可利用的开挖土石方在本项目和相关项目间调配的综合利用量与总开挖量的比例,允许有时空上的差异。

本工程挖方主要来源于建构筑物工程区、道路硬化面及管线区及绿化工程区等。经统计,本工程挖方总量 16.2 万 m³,填方总量为 11.26 万 m³,本项目产生的土石方被项目自身回填利用,弃方总量为 4.94 万 m³,运往利昌环境卫生服务中心阿苏卫渣土消纳场进行综合利用,未发生随意丢弃时间,因此土石方利用率为 100%。

# 6.2.2 临时占地与永久占地比

临时占地与永久占地比指临时占地与项目红线内土地面积的百分比,临时占地主要包括施工道路、施工生产生活区、临时堆土堆料场、取土场等。

本工程临时施工道路、临时堆料、堆土均位于项目区建设单元内,施工生产生活区占地 1.15hm², 位于项目区外, 属于临时占地, 项目红线范围占地 6.19hm², 因此临时占地与永久占地比为 18.58%。

#### 6.2.3 表土利用率

表土利用率指项目区范围内剥离表土的利用量占总量的比率。利用量包括本项目和相关项目的利用量。

经统计,本工程施工过程中剥离表土总量为 1.80 万 m³,剥离表土全部用于后期绿化用土,考虑到表土临时堆放期间的流失量,本项目表土利用率达到 99%。

### 6.2.4 硬化地面控制率

硬化地面控制率指项目区不透水材料硬化地面面积与外环境总面积的百分 比即为硬化地面控制率。不透水硬化地面主要包括硬化不透水的沥青、混凝土路 面、停车场、广场等,外环境总面积指项目区内除建筑设施占地以外的区域面积。

本工程不透水硬化地面 1.04hm², 外环境总面积 3.75hm², 故本工程硬化地面控制率为 27.7%。

#### 6.2.5 雨洪利用率

指项目区内地表径流利用量与总径流量的百分比。

本工程雨洪利用率的计算以整个厂区为主,面积为 6.19hm², 经计算,厂区产生的总径流量为 1036.1m³, 地表径流利用量为 1036.1m³, 计算过程见表 6.2-1。

汇流区域	汇水面积 (hm²)	降雨厚度(mm)	径流系数	径流总量(m³)
屋顶硬化面积	2.44	32.5	0.85	674.05
混凝土路面	1.04	32.5	0.85	287.3
透水砖硬化	0.16	32.5	0.25	13
覆土绿地	0.95	32.5	0.2	61.75
下凹式绿地	1.6	32.5	0	0
合计	6.19			1036.1

表 6.2-1 厂区建设后径流总量计算表

项目区总径流量为 1036.1m³,下凹式绿地储水量 800m³,蓄水池蓄水容积为 500m³。经计算,项目区整体雨洪利用率可达 90%以上,满足设计要求。

项目达标情况:综上可知,本项目建设中采取了一系列的水土保持措施,项目建设过程中,土石方利用率 100%,临时占地与永久占地比为 18.58%,表土利用率 99%,硬化地面控制率 27.7%,雨洪利用率 90%。其中临时占地与永久占地比大于方案中设计的目标值,但项目完工后,拆除施工临建并进行撒播草籽绿化,

土壤侵蚀模数低于扰动前背景值,水土保持治理效果符合水土保持方案及相关规范的要求。

# 7 结论

### 7.1 水土流失动态变化

根据《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008),项目建设完成后: 扰动土地整治率为 100%,水土流失总治理度为 100%,土壤流失控制比为 1.06, 拦渣率为 99%,林草植被恢复率为 100%,林草覆盖率为 41.2%。

根据《北京市房地产项目水土流失防治标准》确定的防治目标,项目建设完成后: 土石方利用率 100%,临时占地与永久占地比为 18.58%,表土利用率 99%,硬化地面控制率 27.7%, 雨洪利用率 90%。

本项目各项指标均达到水土流失防治标准,项目具备水土保持设施竣工验收 条件。

本项目水土壤流失量计算结果显示:本项目实际土壤流失量为 151.33t(其中建设期 140.40t,自然恢复期 10.93t)。土壤流失总量较水土保持方案预测减少 141.55t(其中建设期减少 127.78t,自然恢复期减少 13.77t)。

水土流失量的监测结果显示,工程建设扰动地表造成的土壤流失量明显大于原生地貌土壤流失量,随着水土保持措施的实施和主体工程的逐渐完成,项目区土壤流失量逐渐减少,说明施工过程中采取水土流失防治措施的必要性。

# 7.2 水土保持措施评价

本项目水土流失主要发生在工程建设期,施工中采取的工程措施、临时防护措施有效控制了项目区的水土流失。施工后期植被绿化的恢复等不仅改善了项目区及周边的生态环境,而且抑制了水土流失危害的发生,植物措施在植被恢复期中逐渐发挥其保持水土的作用,实现了水土保持工作的目标。

本工程施工过程中施工单位对地表裸露区域及时苫盖,及时跟进绿化施工,工程施工时序较为紧凑,避免大风、降雨天气施工作业,有效控制了水土流失危害的发生,水土保持效果明显,水土保持工程措施、植物措施运行良好。

# 7.3 存在的问题及建议

建设单位在工程建设期间按照批复的水土保持方案报告书设计要求,严格监管施工单位施工,工程建设期间未发生较大的水土流失问题,主要有以下三个问题,建设单位在今后的开发建设项目中按相关规定实施:

问题: (1)建设单位委托水土保持监测工作阶段为施工阶段,较为滞后,监测单位缺乏对施工前期的水土保持监测数据,未能对项目建设动态进行时时监测。

- (2)施工期间小的水土流失问题为施工道路及其他扰动土地裸露区域苫盖不到位,排水沟堵塞未能及时清理等。
  - (3)施工临时占地面积较大,临时占地与永久占地比超出方案设计目标。
- 建议: (1)建设单位在今后的项目开发建设过程中,应注意在项目建设前,就应该委托相关单位进行水土保持监测工作。
- (2)建设单位在今后的开发建设项目中应注意对水土保持临时措施的实施及后续运行情况定期或不定期检查,确保实施的水土保持措施发挥最大效益。
- (3)建设单位应在今后的开发建设项目中,控制临时占地面积,尽量少占 用红线范围外用地。

#### 7.4 综合结论

本工程针对主体工程特点采取的水土保持措施合理有效,按照水土保持方案中设计的各类措施要求完成了水土流失防治工作,水土流失防治效果满足国家 6 项指标要求,满足水土保持方案中要求的各项防治目标,各项水土保持工程质量基本达到规定要求,有效改善了厂区的生态环境状况。工程试运行期间,水土保持设施能发挥其水保作用,项目区水土保持效果良好。

# 8 附件、附图

#### 附件

附件1 监测工作委托合同

附件 2 原始监测记录表

附件3 监测照片集

附件 4 水保方案批复文件

#### 附图

附图 1 项目地理位置图

附图 2 水土保持监测点分布图

附图 3 防治责任范围图

# 昌平区镇级污水处理设施建设运营项目小汤山镇再生水厂一期工程水土保持监测特性表

				主体	本工程主要技	支术指标				
项目 名称		目	平区镇级	污水处理证	<b></b>	营项目小汤:	山镇再生水厂-	一期工程		
建设规模	水厂规划总占地面积 14.01hm², 其中一期建设用地 6.19hm², 二期建设用地 4.01hm², 根据本项目规划设计方			建订	建设单位、联系人 建设地点 所属流域 工程总投资			(北京)水务 公司 11048756 昌平区 「流域 (乙元)		
					ベニ保持监測	    	工程总工期		26 1	<u>- کا</u>
		监测单位	国水江		)工程咨询		联系人及甲	申任	王 克 18	31126/216
	1		日水江		· -原区	TIMAR			一	
		当然起生失主 监测指标		•	•		监测指标	,		, -
监	监测指标     监测方法(设施)       1.水土流失状况监测     调查			2.防治责任范	•	调查、实测				
监测内容	3.水土保持措施情况监测 调查、巡查、样方法			=	4.防治措施效					
容	-	5.水土流失危害监测			、巡查		水土流失背	,	200t/ (k	
					)3hm <sup>2</sup>		土壤容许流	失量	200t/ (k	m <sup>2</sup> ·a)
		水土保持投资		639.	76 万元		水土流失目	,	200/ (k	m²·a )
		防治措施	道路村 槽1座; 绿化万主 1.45万 措施工生产 160kg;	t 它要 化工 定主要 完 500m <sup>2</sup> 元 500m <sup>2</sup> 元 生 活 性	临时排水海程措施主要3集雨池1点2网产工程措施2点2两产品,1.90元成工程措施2两产品,1.90元成工程,1.90元元程,	二程措施主要 日 1569m、临 平有: 节水灌 座、沉淀池 1 6hm²、撒播 起主要有: 表	有:表土剥离 面时沉沙池 5座 题工程 1697m 座;植物措施 草籽 138kg; 土剥离及回覆 45m²、植草砖针 木 218 株。	、防尘网克、下凹式惠 主要有: 约	is is 20490m <sup>2</sup> 整地 1.60hm <sup>2</sup> 录化美化 2.5 3;植物措施	2、车辆清洗 、表土回覆 5hm <sup>2</sup> ; 临时 有撒播草籽
		分类指标	目标值	达到值			实际监测	则数量		
		扰动土地整治率(%)	95	100	防治措 施面积	3.86hm <sup>2</sup>	永久建筑物 及硬化面积	3.48hm <sup>2</sup>	扰动土地 总面积	7.34hm <sup>2</sup>
		水土流失总治理度(%)	95	100	防治责任	范围面积	7.34hm <sup>2</sup>	水土流	失总面积	7.34hm <sup>2</sup>
	防治效果	土壤流失控制比	1.0	1.06	工程措	施面积	0.16hm <sup>2</sup>	容许土	壤流失量	200t/ ( km <sup>2</sup> ·a )
监测结论	效果	林草植被恢复率(%)	97	100		施面积	2.55hm <sup>2</sup>		裏流失情况	189t/ (km²·a)
· 给		林草覆盖率(%) 	30   34.74   可恢复林草植被面积   25   99   实际拦挡弃土(石、			弃土 (石、	2.55hm <sup>2</sup> 4.94 万 m <sup>3</sup>		植被面积 石、渣)量	2.55hm <sup>2</sup> 4.94 万 m <sup>3</sup>
	力	《土保持治理达标评价	项目	  各项评价	指标符合开		  水土流失防治  的水土流失防	 标准、北京		目水土流失
		总体结论	各分	<b>个区采取了</b>		上保持措施,	水土保持工程 案报告的设计要	总体布局台	·理,效果明	显,达到水
		主要建议	位进行水 (2)建 况定期或	《土保持监 设单位在~ 该不定期检	∑测工作。 今后的开发 ☆,确保匀	开发建设过建设项目中 完施的水土保	程中,应注意	在项目建设 保持临时措 大效益。	<b>;施的实施及</b>	后续运行情

# 附件1-监测工作委托合同

正本

合同登记编号:

2 J N Y L - G C - 20 , 6 ,

2016-015

# 技术咨询合同书

项 目 名称: 昌平区镇级污水处理设施建设运营项目小汤山镇再生水厂一期工程

甲方 (委托方): 中节能燕龙 (北京) 水务有限公司

乙方 (受托人): 北京渤海嘉实工程咨询有限责任公司

签订地点: 北京

签订日期: \_\_\_\_\_

有效期限: \_\_\_\_\_



-
3
Luc
国州
T
127
71.
4

						T	
	名称(或姓名)				(签 章)		
54	法定代表人	ON.	80		(签 章)		17/
	委托代理人	s .		-	(签 章)	技术合同	1美用章
托人(	联系(经办)人				(签 章)	今降卷	公章
(甲方)	住所			邮政		7000001	34308
	(通讯地址)			编码			
	电话		传真				
	开户银行	N.				年	月日
	帐 号			7/			
	名称(或姓名)	北京渤海嘉实工	程咨询不	有限责任	公司(签 章)	)	
	法定代表人	fz.	133		(签章)	是咨询	THE PARTY OF THE P
	委托代理人		/		(签 章)	技术合同	41
受托	联系(经办)人				(签章)	单位	公章
受托人(乙方)	住所	北京市丰台区 环西路 69 号中		邮政	100071	Vi. Irr	
	(通讯地址)	邦 406	T	编码			
	电话	57405419	传真				-
	开户银行	中国工商银行 支行	股份有	了限公司	]北京青年湖	年	月日
	帐 号	0200 2043 192	20 002	6 988			

# 联合体协议

北京渤海嘉实工程咨询有限责任公司、国水江河(北京)工程咨询有限公司、 北京中水渤海工程监理有限责任公司(所有成员单位名称)自愿组成联合体,共 同参加<u>昌平区镇级污水处理设施建设运营项目小汤山镇再生水厂一期工程监测、</u> 监理及验收项目。现就联合体合作事宜订立如下协议。

- 1、北京渤海嘉实工程咨询有限责任公司(某成员单位名称)为牵头人。
- 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目合同谈判活动,并代表 联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与之有关的一切事务,负责 合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
- 3. 联合体牵头人代表联合体签署一切文件,联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
  - 4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下:

北京渤海嘉实工程咨询有限责任公司承担本项目水土保持验收工作;

国水江河(北京)工程咨询有限公司(成员一名称)承担本项目<u>水土保持监</u> 测工作;

北京中水渤海<u>上程监理有限责任公司(成员二名称)</u>承担本项目<u>水土保持监</u> 理工作。

- 5. 联合体在项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
- 6. 本协议书自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效。
- 7. 本协议书一式 四 份,建设单位和联合体各成员各执一份。

牵头人名称: \_ 北京勃 <u>咨询有限责任公司</u> (盖单位章)

法定代表人:

(签字)

成员二名称: 北京中水渤海工程监理有限责任公司 (盖单位章)

法定代表人:

日期: 2016年 / 月20日

# B1 扰动土地情况监测记录表

项目名称	温和额似	这个知识的的意	发达管理目的认识	随厨生水1	
编号			<b>发运营业</b> 单小分点 监测分区	工程建	谈区
地点	4	汤山镇			
	扰动形式	扰动宽度(m)	扰动面积 (m²)	扰动前土	地利用类型
	占压			团也	须用地
			= 414		
扰动情况	示意图及尺寸标注		一块山南地		
	整治	i 方式	整治面积 (m²)	整治后土	地利用类型
整治情况	示意图及尺寸标注				
现场情况	1,20	置主体已完工, 15% 没致合。	<b>夸、液料植</b>	11% 图3	7. 双约中
	2017.3.	. 7		填表人	张至像

R6 丁程措施监测记录表

			11											,	中	编	
								1.5						2017.65.19	<b>追侧口别</b>		
				41											经纬度	位置	
			12										j	道路1福区	分区	监测	
	21		ы		**									过小戏前农	类型	措施	
														6.3	日期	开工	DO 上作到
7 8	7				117.			11	_ 1					6.7	日期	完工	20 上注通過無数元次へ
		-						U		35		3*			PLIT	却紋	47.47
											- X		3	100m2		工程	V.
					1									S. S.	状况	运行	
														拉尔	效果	防治	
									- 1						建议		
	B					R								深風船		植表人	

										2.	į.		·-	雏号	
										2017.6.19			12.5.[100]	监测日期	
2.			11 × 28											位置/经纬度	
						12		4	i.	海路上級区海水路里	(100mm) (100mm) (100mm)	NATE	通路1线区域10分15至	监测分区	
										北京小田	場が切り	からえない	海温水	措施类型	D
										1	1.1	2.1	2.}	开工日期	Do 面的短周围约马头久
	79.									6.19	3,22	2.5	2.4	完工日期	国然ろそを
										19633	166%	Mode	160m	工程量	
										,,	;	,	ZA	运行状况	
										2000	多位	急	RJ.	防治效果	
												の大きかり		问题及建议	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										1	1 -	1	がある	填表人	

R7 植物措施监测记录表

													=						1.	是是
														Ą					1017, [19	监测日期
					а						¥r			,	3-					位置/经纬度
•			я									a a			11				城化了程区	监测分区
I Ki	る。	八旅谷兴	被	白光小	加量	从生元京机	从中极古太、	选业油松	元次	金叶长点	大少微态	家孩	ちんな	A.	高高	なが	应应然	态共	西	措施类型
43	5.24	なみ	8%	\$.73	813	5.70	8.70	5,70	5,/0	71.5	5.3	417	5,/0	5.9	4.71	4.70	5,6	4.7	4.15	开工日期
(1,2)	5.27	4.30	٧i 	SIL	XX	13	5.2	5.1	8.12	(1,2	5.6	81.4	11.8	5.10	477	4.11	5.7	4.12	81.7	完工日期
S A	がい	348	名家	二次	以家	文本	に本	数と	22条	1	多に	254	76条	がら	<b>25%</b>	******	3架	次次	<b>**</b> 3.5	工程量
																g				覆盖度
																				成活率
																6				问题及建议
<i>^</i>			5	11	,		, -		1.	, .			1,		- ,			• •	兴运馆	填表人

B7 植物拱端迟测记录表

									2						70)	淵 告鹏	
			= (												217.6.19	监测日期	
	×			5		٠										位置/经纬度	
			2												经公司银	超测分区	
		,								阿罗	大日次花	極早本	水路金	Ki	红机	措施类型	t' -
										11	1	6.10		1	6.1	开工日期	D. H. WILLIAM CO.
		2	V								6.12		6,3		6.3	題	2 1027. 24
ш							8	(4) 		15/m2	164	が元	374	で本	9.4%	工程量	
		3											, i			覆盖度	
									i i						1	成活率	
										-						问题及建议	
															然少品	填表人	# 50 50 50 50 F

ŀ			
		Z	1
	1日1日2日日1111111111111111111111111111111		ロオオーでに、ロー
ı			

						9	00	7	6	4	4	n	2	-	ᆁ	编
						2010.10.2)	(2.01. gral	11.6.Me	12.P. Max	1.8.8loc	41.1.310	2016.7.14	4.480	2016.4.4	监侧口别	마유니 전에
						2	o	2	2	"	//	14	-//	2016.4.24 Wood 25"E16362)	经纬度	位置
						绿化瑶丛	3条41据》	弘金流	绿化沸龙	绿心超	治路及处区	道路硬位	道路硬化区	"海晚晚还	分区	监测
						大三分子	土地整治	が回答	ないが発送をからい	下四多级的数据公司	四八四八 游戏外歌	海域域域	送送省	Sooman	类型	措施
				# # A A A A A A A A A A A A A A A A A A		वित्विवा	क्रिक्षिया	0月1月	हे १ मे । ब	R228	阿四八	78313	मन्नम्ब	4010	日期	开工
						101र्ष्ट्रावा	1018 101	1 Pal 1 Pal	9.21.40	हारमिष्ठ	7月3回	7月6日.	4别切	4मुड्य	日期	完工
					, A								mornisme	\$wam3	HInk/	却松
						500 Jano	0,2 hm3	2008 gas	KITE.	12hm²	1845 m2	248m2	河	黨		上程
	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100				Times	Sar.	Men,	Ym	Zon	M	Yan	Zar	17 Jun	Year,	状況	运行
						2001	ZOV.	8m	DW	XAR	Yan	Xan	Am	. Nati	效果	防治
			As The			24,	7			Ç4.	な	45	足數處對於海險	.4.	建议	问题及
						故総当	故籍沿	安徽省	表稿卷	灰路路	英統岛	ある場	世城南	长鹤面		<b>埴</b> 表人

R7 植物拱端迟测记录表

1 / X						S			4	2	1		编号	
				130					2016.102	2016.10.2)	2016.9.24	45.p. 8/00	监测日期	
							lug l		1,	1-		"(c,95,9117" 45,609N	位置/经纬度	
									在賽學院 又與代形整理	域小域	戏靶小彩	强小强区	监测分区	
						4			北海金沙海州	多人对意义 光海水岛南	经海野群 次起几分类	残化2据以表值/o传被	措施类型	
									10R212	10 m 21 m	9月24里	内(本)	开工日期	
									10月24日	四天外到	Property	10000000000000000000000000000000000000	完工日期	
		iliv							的林	21974	60/59	3000	工程量	
											.80%		覆盖度	
													成活率	
									及珠況水	及此地大	, an	か	问题及建议	
					Line Company				世路君	1	被做会	应指性	填表人	

B& 层时排描示测记录表

				×					00.	7	6	~	4	S	2		编号	
						1 3			2016. 11.22	2016.10.23	20/6.9.24	2016.8.15	41.1.6/01	2016.5.16	4x.4.2/10c	4.4.8lac	监测日期	
									12	1/	1	"	(1	1,	( )	汉羟TW的著作外别到,在80分分 大少9100	位置/经纬度	
						E			心动物的	學的學	以阿布沙	既你站截	建筑的沿岛空间越	不到作例	建筑物话》	<b>漫选的</b> 超2	监测分区	
									路過期	探察	學之類	行数分響す	四种地图	路路	上海多雄	(法)则是	措施类型	U
									松公利!	9月1年回	9नेका	11年1日		Jrg 72		49712	开工日期	りの「山中」」日が見出次。これな
				*		N IA	×		1/299 BAZEIII-	的多分	1000	ながはな	加多地	1879	は多数	四9日	完工日期	14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
									8657m	1262	foon?	4063	Hont	. 7 forms	20分	120m2	工程量	
									ישק	Sal.	יועק				NO -	南	运行状况	
Y I									NOW YOU	Per	MIL	Tes	呱	名	Dan	ישק	防治效果	
	× .	15)							か	た	か	か	楽編	对警院通過	1 20	さ	问题及建议	
	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	3 2					1159	line in the second	技統省	英統兵	故描述	故能也	进数进	多點海	故為治	赵智他	填表人	

# 附件 3-水土保持监测照片集









# 北京市昌平区水务局文件

昌水行许字[2014]61号

# 北京市昌平区水务局

# 关于昌平区镇级污水处理设施建设运营项目 小汤山镇再生水厂一期工程水土保持方案 报告书的批复

申请单位:中节能燕龙(北京)水务有限公司

法人代表: 邢俊义

地 址: 北京市昌平区宏创科技园 11号

你单位在<u>昌平区水务局</u>申请的<u>昌平区镇级污水处理设施建设</u> 运营项目小汤山再生水厂一期工程水土保持方案报告书行政许可 事项,经我局研究认为符合《中华人民共和国水土保持法》、《北 京市实施<中华人民共和国水土保持法>办法》、《开发建设项目水土保持方案管理办法》以及《开发建设项目水土保持方案编报审批管理办法》的规定,并且申报材料齐全,现批复如下:

- 一、该报告书编制依据充分,内容较全面,水土流失防治目标和责任范围明确,水土保持防治措施基本可行,可以作为水土保持工作的依据。
- 二、同意水土流失现状分析。项目区处于暖温带大陆性季风气候,多年平均降水量 574mm; 水土流失以微度水力侵蚀为主,属北京市人民政府公告的水土流失重点预防保护区。同意水土流失预测方法,预测工程建设期造成的水土流失总量为 292.88t, 扰动地表面积 7.79hm²。
- 三、同意水土流失防治责任范围面积为 8.03hm², 其中建设区 7.79hm², 直接影响区 0.24hm²。
- 四、同意水土保持方案编制的各项水土保持措施,要求严格按照批复的水土保持方案实施各项水土保持工程。
  - 五、基本同意水土保持投资估算编制的原则,依据和方法。
  - 六、建设单位在工程建设中要重点做好以下工作:
- 1、按照批复方案抓紧落实资金、管理等保障措施,做好下阶段的工程设计、招投标和施工组织工作,加强对施工单位的管理,切实落实水土保持"三同时"制度。
  - 2、定期向水行政部门通报水土保持方案的实施情况,并接受

有关水行政主管部门监督检查。

- 3、委托有水土保持监测资质的机构承担水土保持监测任务, 定期向水行政主管部门提交监测报告。
- 4、加强水土保持工程建设监理工作,确保水土保持工程建设质量。
  - 5、水土保持后续设计报水行政主管部门。

七、建设单位要按照《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的规定,按时申请并配合水行政主管部门组织水土保持设施的竣工验收。

八、水保设施未建成、未经验收或者验收不合格,主体工程不得投入运行。已投入运行的,水行政主管部门责令限期完建有关工程并办理验收手续,逾期未办理的,将追究有关法律责任。

九、在项目立项前到水务局征求该建设项目涉水意见。在项目建设过程中依法落实涉及水保、供水、排水、污水、防洪等相关规定。

北京市昌平区水务局
2014年7月14日
「政许可专用書


抄送: 办公室、水保站、水政监察大队、小汤山水务站


北京市昌平区水务局

2014年7月14日印发



附图-01 项目区地理位置图

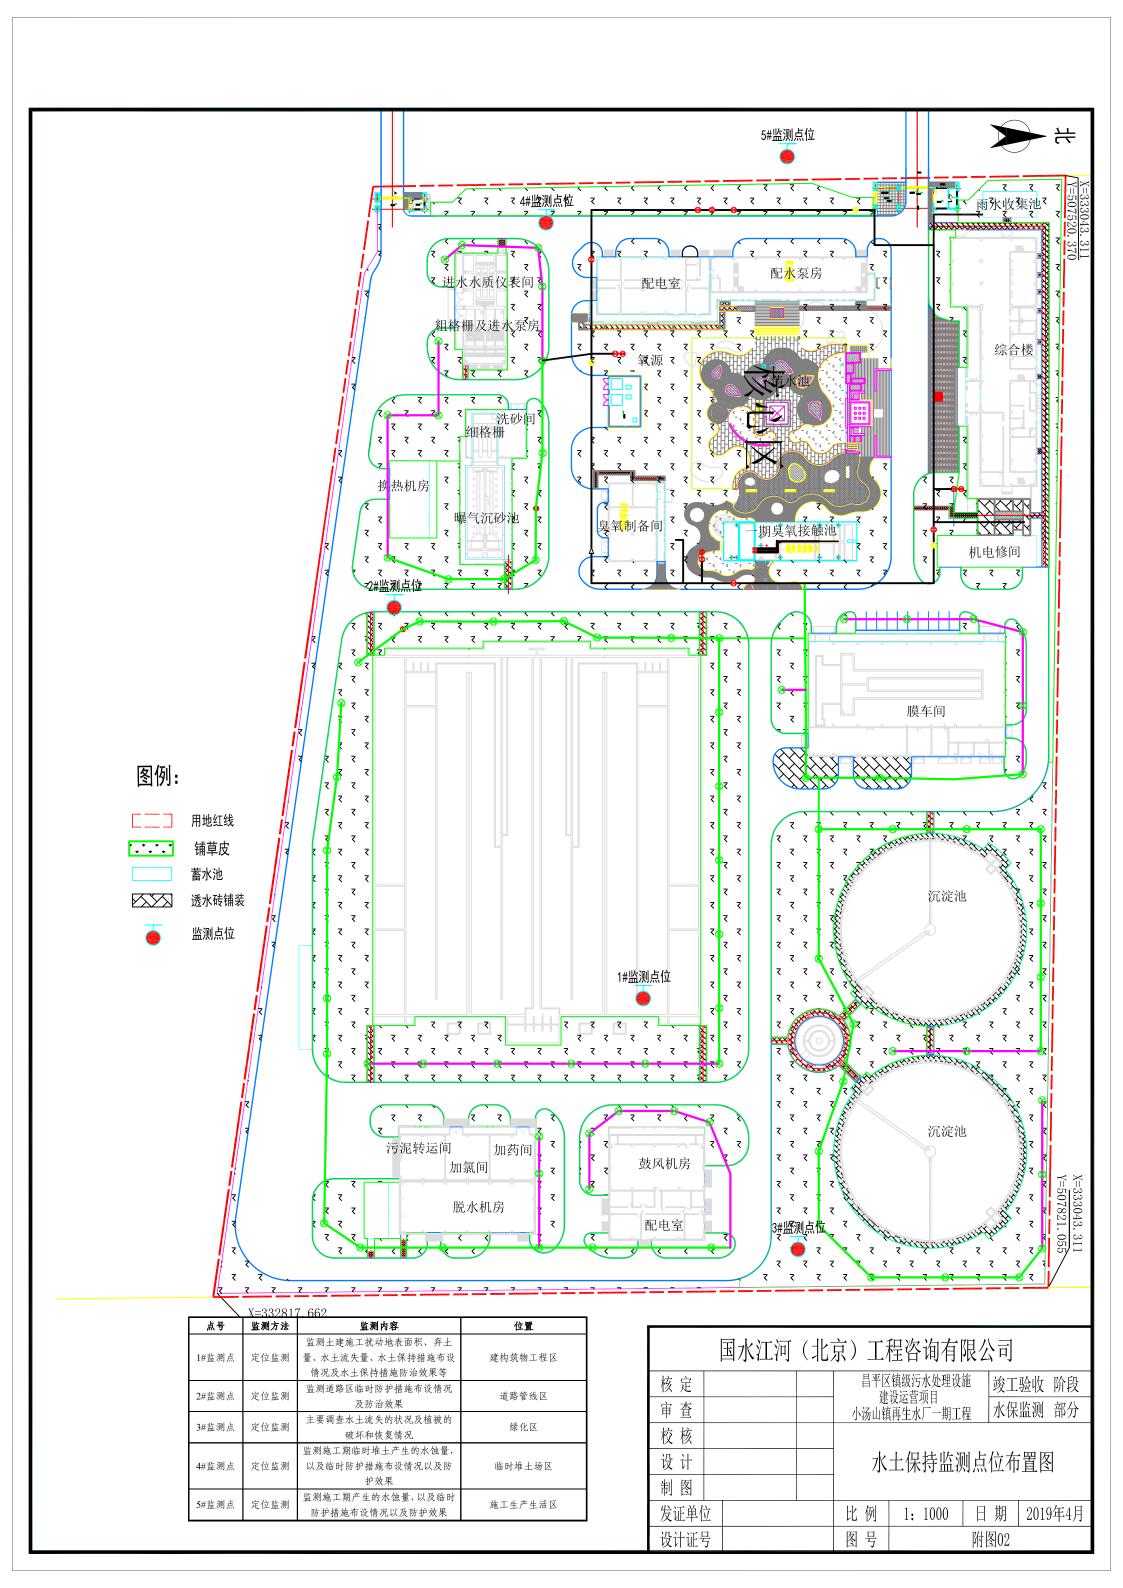

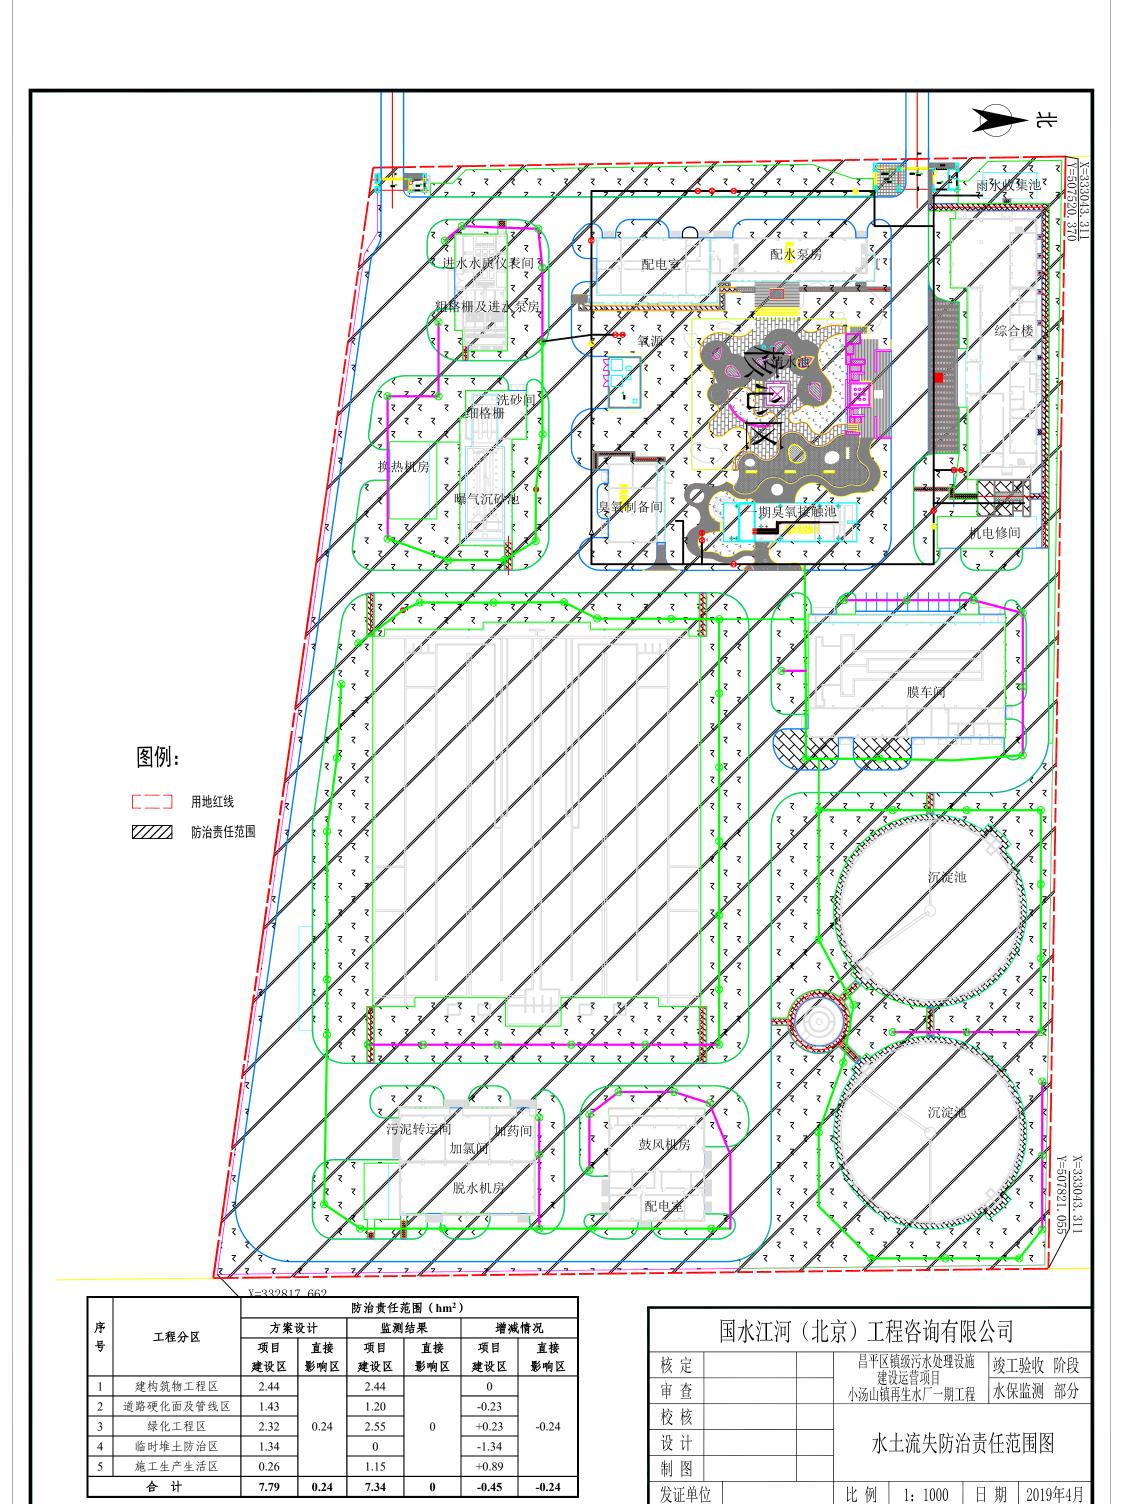

设计证号

图号

附图03
